



Of. nº 10/752-SEMAP/DGD/ICB

Novo Hamburgo, 07 de outubro de 2020.

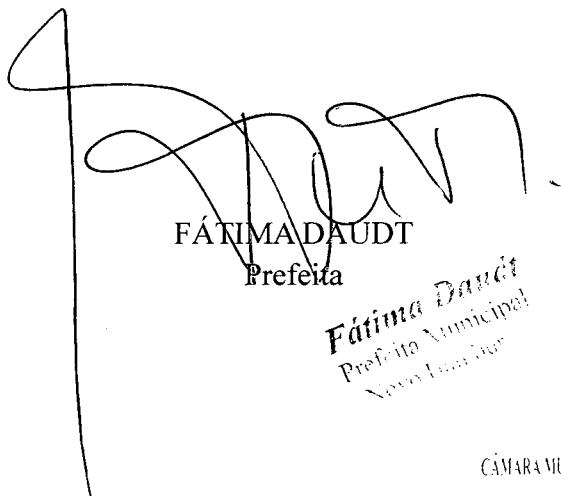
Ao Excelentíssimo Senhor  
**GERSON PETEFFI**  
Presidente da Câmara de Vereadores  
Novo Hamburgo – RS

**Assunto:      RESPONDE REQUERIMENTO Nº 726/2020  
                  PROTOCOLO Nº 726559/2020**

Senhor Presidente,


Vimos à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao Requerimento em epígrafe, de autoria do Vereador Cristiano Coller, encaminhar resposta através do Ofício nº 120/2020, em anexo, expedido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários.

Atenciosamente,

  
FÁTIMA DAUDT  
Prefeita

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO  
PROTOCOLO  
DOC Nº 918/2020 16:24

14 OUT. 2020

  
Eriqui



Ofício n° 120/2020.

Novo Hamburgo, 05 de outubro de 2020.

**Ao excelentíssimo  
GERSON PETEFFI  
Presidente da Câmara de Novo Hamburgo  
Novo Hamburgo - RS**

Assunto: Resposta ao requerimento n° 726/2020.

Em resposta ao requerimento n° 726/2020, vem a Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários – SEMOPSU, vem informar que:

Os recursos destinados para a obra são provenientes de duas fontes, ou seja, R\$ 246.000,00 de recursos da união, através de emenda parlamentar e contrapartida do município no valor de R\$111.360,89, totalizando o investimento em R\$ 357.360,89.

A obra foi licitada no ano de 2019, Edital tomada de preços n° 08/2019, firmando-se o contrato em 11/10/2019.

Todo o processo licitatório e contrato foi submetido à apreciação da Caixa Econômica Federal, e esta, apenas em 09/04/2020, fez a autorização de início de obra para o município. A empresa contratada foi contatada para que o município emita a ordem de Início de Serviços, entretanto, está, manifestou desinteresse pela continuidade do contrato, revelando que protocolaria pedido de distrato, pelo prazo decorrido e o evento da pandemia tê-la feito desmobilização de equipe.

De acordo com o exposto no parágrafo retro, não há previsão de conclusão da referida Obra, uma vez que o prazo de sua execução é de 04 meses.

Atenciosamente,

Paulo Rogério Trindade de Vargas  
Secretário de Obras Públicas, Serviços  
Urbanos e Viários
